

工事のお知らせ

回覧

日頃より、皆様方には工事に対し深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

工事予定と現在の進捗状況をご報告させていただきます。P4 橋脚工事は、11 月 19 日に最終コンクリートの打設を完了し、無事に工事を終えることができました。今後は、P3 橋脚に関連する工事を主として工事を進めていく予定となります。

工事についてご不明な点やお気づき点がございましたら、お手数ではございますが下記連絡先まで、ご一報くださいますようお願い申し上げます。

地元の皆様方には、工事の騒音等によりご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、細心の注意を払って工事を行いますので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

【工事予定】

主な工事	1月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
栈橋工事																																	
吊降し栈橋工事																																	

【主な作業予定】

- 栈橋工事（1 月下旬 施工完了予定）
 - ① 杭を打設する作業
 - ② 橋桁をクレーンにより架設する作業
- 吊降し栈橋工事（1 月下旬 施工開始予定）
 - ① 杭を打設する作業
 - ② 桁をクレーンにより架設する作業

【作業時間】

- 栈橋工事： 6 時～22 時
 - 吊降し栈橋工事： 6 時～22 時
- ※作業内容により作業時間が多少変更になる場合があります。

連絡先

**安藤ハガマ** 新野積橋作業所

電話番号：0258-89-6846


事務所住所：寺泊野積107-38

現場代理人：八島 明生

監理技術者：立川 大介

【進捗状況】 令和元年12月16日 現在

• 下流側から撮影

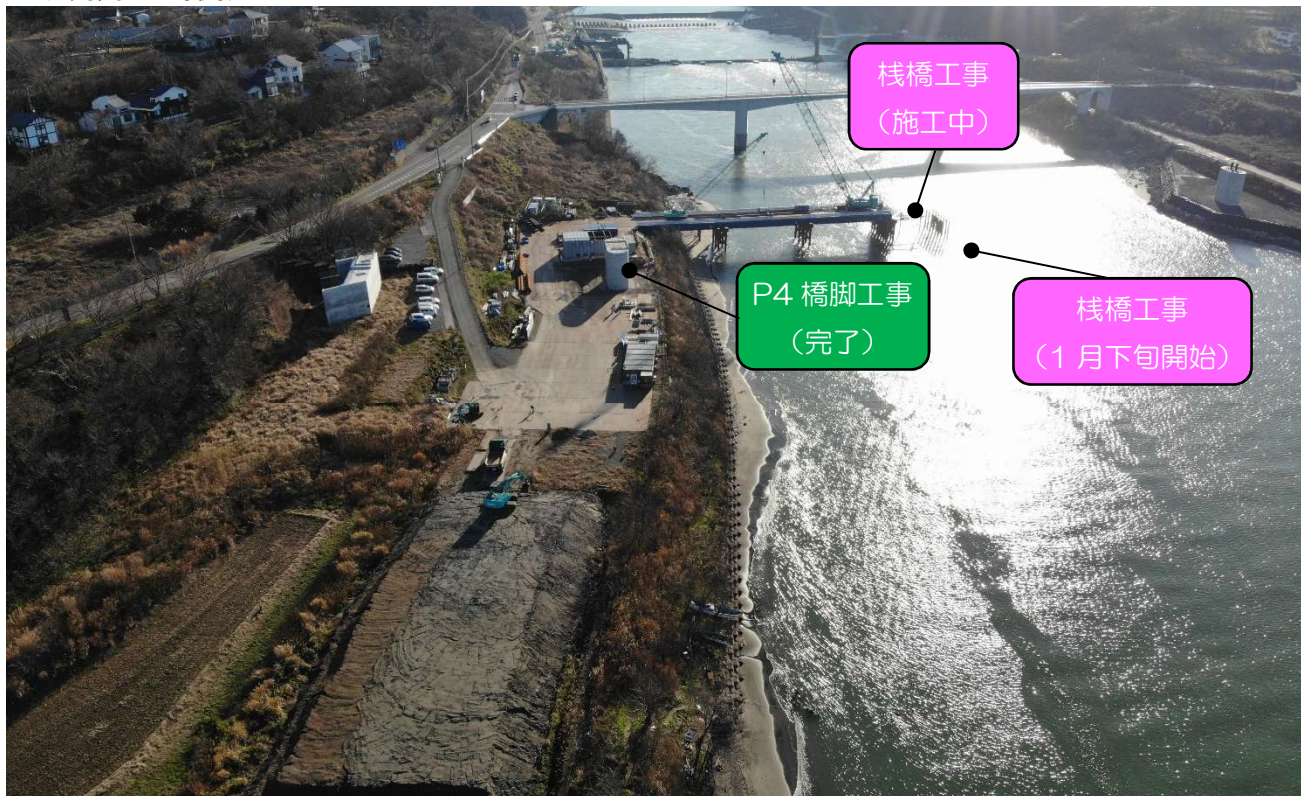

• 上流側から撮影

